ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Dokončeno %
1	**Časový průběh stavby**	**292,4 dny**	**3.6. 14**	**3.8. 15**	**0%**
2					
3	**RDS**	**55,4 dny**	**3.6. 14**	**22.8. 14**	**0%**
8					
9	**Přípravné práce, ZS a DIO**	**292,4 dnv**	**3.6. 14**	**3.8. 15**	**0%**
10	Předání staveniště	1 den	3.6. 14	4.6. 14	0%
11	Zřízení DIO	1 den	8.8. 14	9.8. 14	0%
12	Zrušení DIO	1 den	31.7. 15	1.8. 15	0%
13	Zařízení staveniště	4 dny	10.6. 14	14.6. 14	0%
14	Zrušení zařízení staveniště	1 den	1.8. 15	3.8. 15	0%
15	Předání díla	0 dny	3.8. 15	3.8. 15	0%
16					
17	**Přípravné práce**	**24 dny**	**12.6. 14**	**16.7. 14**	**0%**
18	Odpojení přípojek RWE + ČEZ	15 dny	12.6. 14	3.7. 14	0%
19	Statické zajištění č.p. 305	10 dny	14.6. 14	28.6. 14	0%
20	Demolice objektů	15 dny	25.6. 14	16.7. 14	0%
21					
22	**SO 202 Most**	**116,8 dnv**	**7.6. 14**	**24.11. 14**	**0%**
23					
24	**Zemní práce-Demolice**	**48 dny**	**7.6. 14**	**15.8. 14**	**0%**
31					
32	**Svislé konstrukce**	**50 dny**	**21.7. 14**	**1.10. 14**	**0%**
48					
49	**Zemní práce**	**16 dny**	**1.10. 14**	**24.10. 14**	**0%**
52					
53	**Vodorovné nosné konstrukce**	**42,2 dnv**	**24.9. 14**	**24.11. 14**	**0%**
65					
66	**Kamenické práce**	**215 dny**	**5.9. 14**	**15.7. 15**	**0%**
67	Obklad NZ	215 dny	5.9. 14	15.7. 15	0%
68	Obklad opěr mostu	14 dny	1.4. 15	21.4. 15	0%
69					
70	**Inženýrské sítě**	**255,6 dnv**	**23.6. 14**	**30.6. 15**	**0%**
71	Přeložka VO	20 dny	23.6. 14	21.7. 14	0%
72					

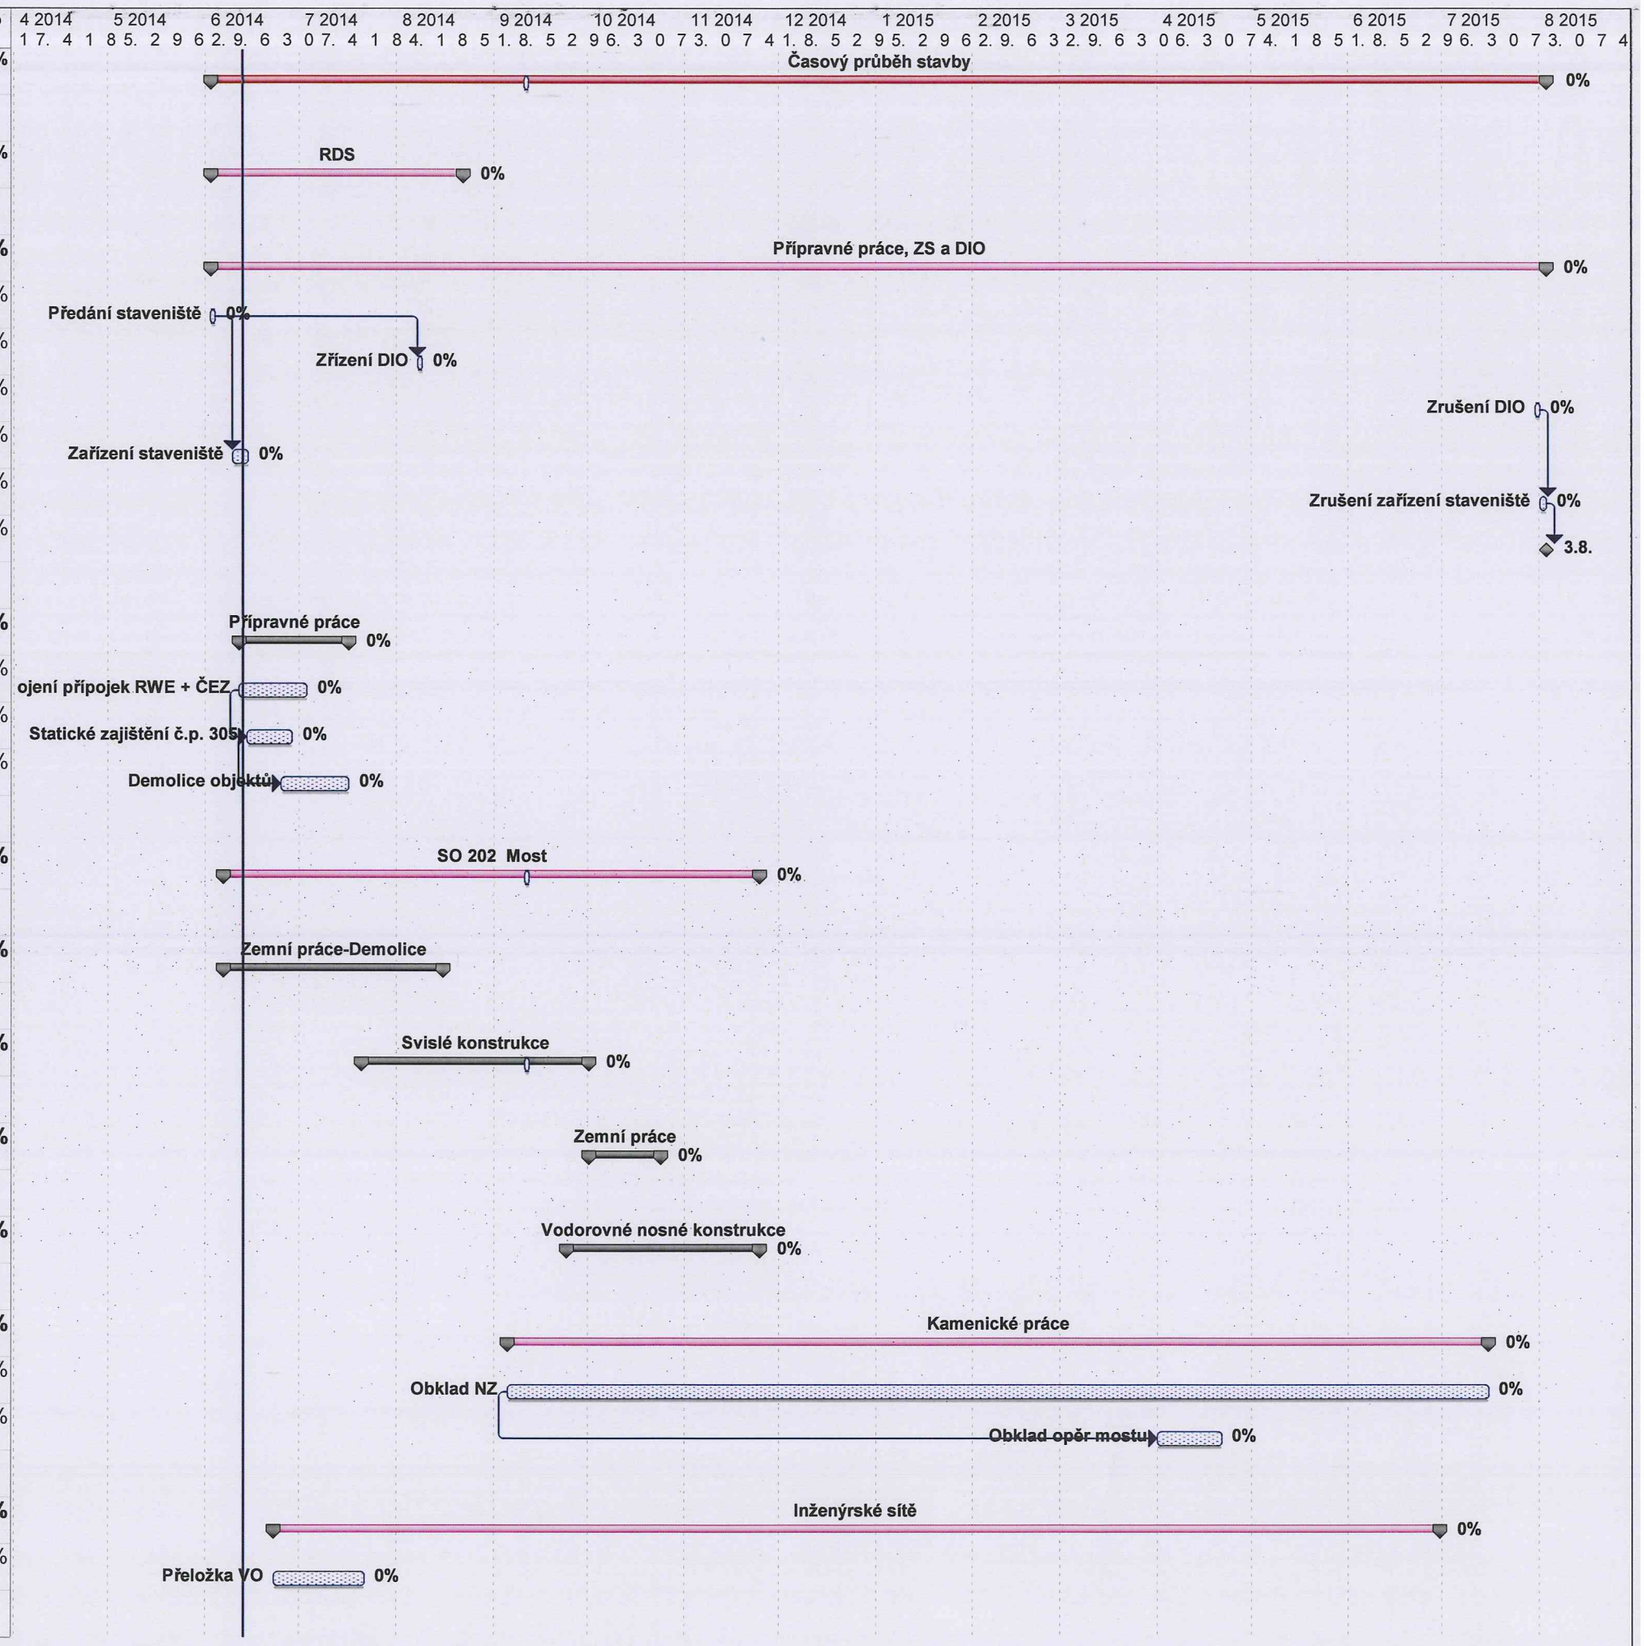

Projekt: HMG-Most Sloup-2.
Datum: 13.6. 14

Úkol | Průběh | Souhrnný | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení | Milník | Souhrn projektu | Vnější milník

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Dokončeno %
73	**Etapa 1. - ZÚ**	**50 dny**	**2.8. 14**	**14.10. 14**	**0%**
74	**Vodovod**	**25 dny**	**2.8. 14**	**8.9. 14**	**0%**
77	**VO**	**25 dny**	**9.8. 14**	**15.9. 14**	**0%**
80	**Dešťová kanalizece**	**20 dny**	**15.9. 14**	**14.10. 14**	**0%**
83	**Etapa 2. - střed**	**7 dny**	**7.8. 14**	**16.8. 14**	**0%**
84	**O2**	**7 dny**	**7.8. 14**	**16.8. 14**	**0%**
87	**Vodovod**	**7 dny**	**7.8. 14**	**16.8. 14**	**0%**
90					
91	**Etapa 3. - KÚ**	**62 dny**	**1.4. 15**	**30.6. 15**	**0%**
92	**VO**	**35 dny**	**1.4. 15**	**21.5. 15**	**0%**
95	**Dešťová kanalizece**	**27 dny**	**21.5. 15**	**30.6. 15**	**0%**
98	**O2**	**28 dny**	**1.4. 15**	**11.5. 15**	**0%**
101					
102	**Komunikace**	**250,8 dny**	**1.8. 14**	**1.8. 15**	**0%**
103	**Etapa 1.**	**243,2 dny**	**1.8. 14**	**21.7. 15**	**0%**
114					
115	**Etapa 2.**	**86 dny**	**30.3. 15**	**1.8. 15**	**0%**
126					
127					
128	**Nábřežní zeď**	**252,8 dny**	**1.7. 14**	**3.7. 15**	**0%**
129	Demolice stávající NZ	16 dny	1.7. 14	23.7. 14	0%
130					
131	**Etapa 1.**	**29 dny**	**8.7. 14**	**19.8. 14**	**0%**
146	Etapa 2.	28 dny	22.7. 14	1.9. 14	0%
147	Etapa 3.	28 dny	1.8. 14	11.9. 14	0%
148	Etapa 4.	28 dny	12.8. 14	20.9. 14	0%
149	Etapa 5.	28 dny	21.8. 14	1.10. 14	0%
150	Etapa 6.	28 dny	1.9. 14	11.10. 14	0%
151	Etapa 7.	28 dny	11.9. 14	22.10. 14	0%
152	Etapa 8.	28 dny	22.9. 14	31.10. 14	0%
153	Etapa 9.	28 dny	1.10. 14	11.11. 14	0%
154	Etapa 10.	28 dny	11.10. 14	21.11. 14	0%
155	Etapa 11.	28 dny	22.10. 14	2.12. 14	0%
156	Etapa 12.	28 dny	1.11. 14	11.12. 14	0%

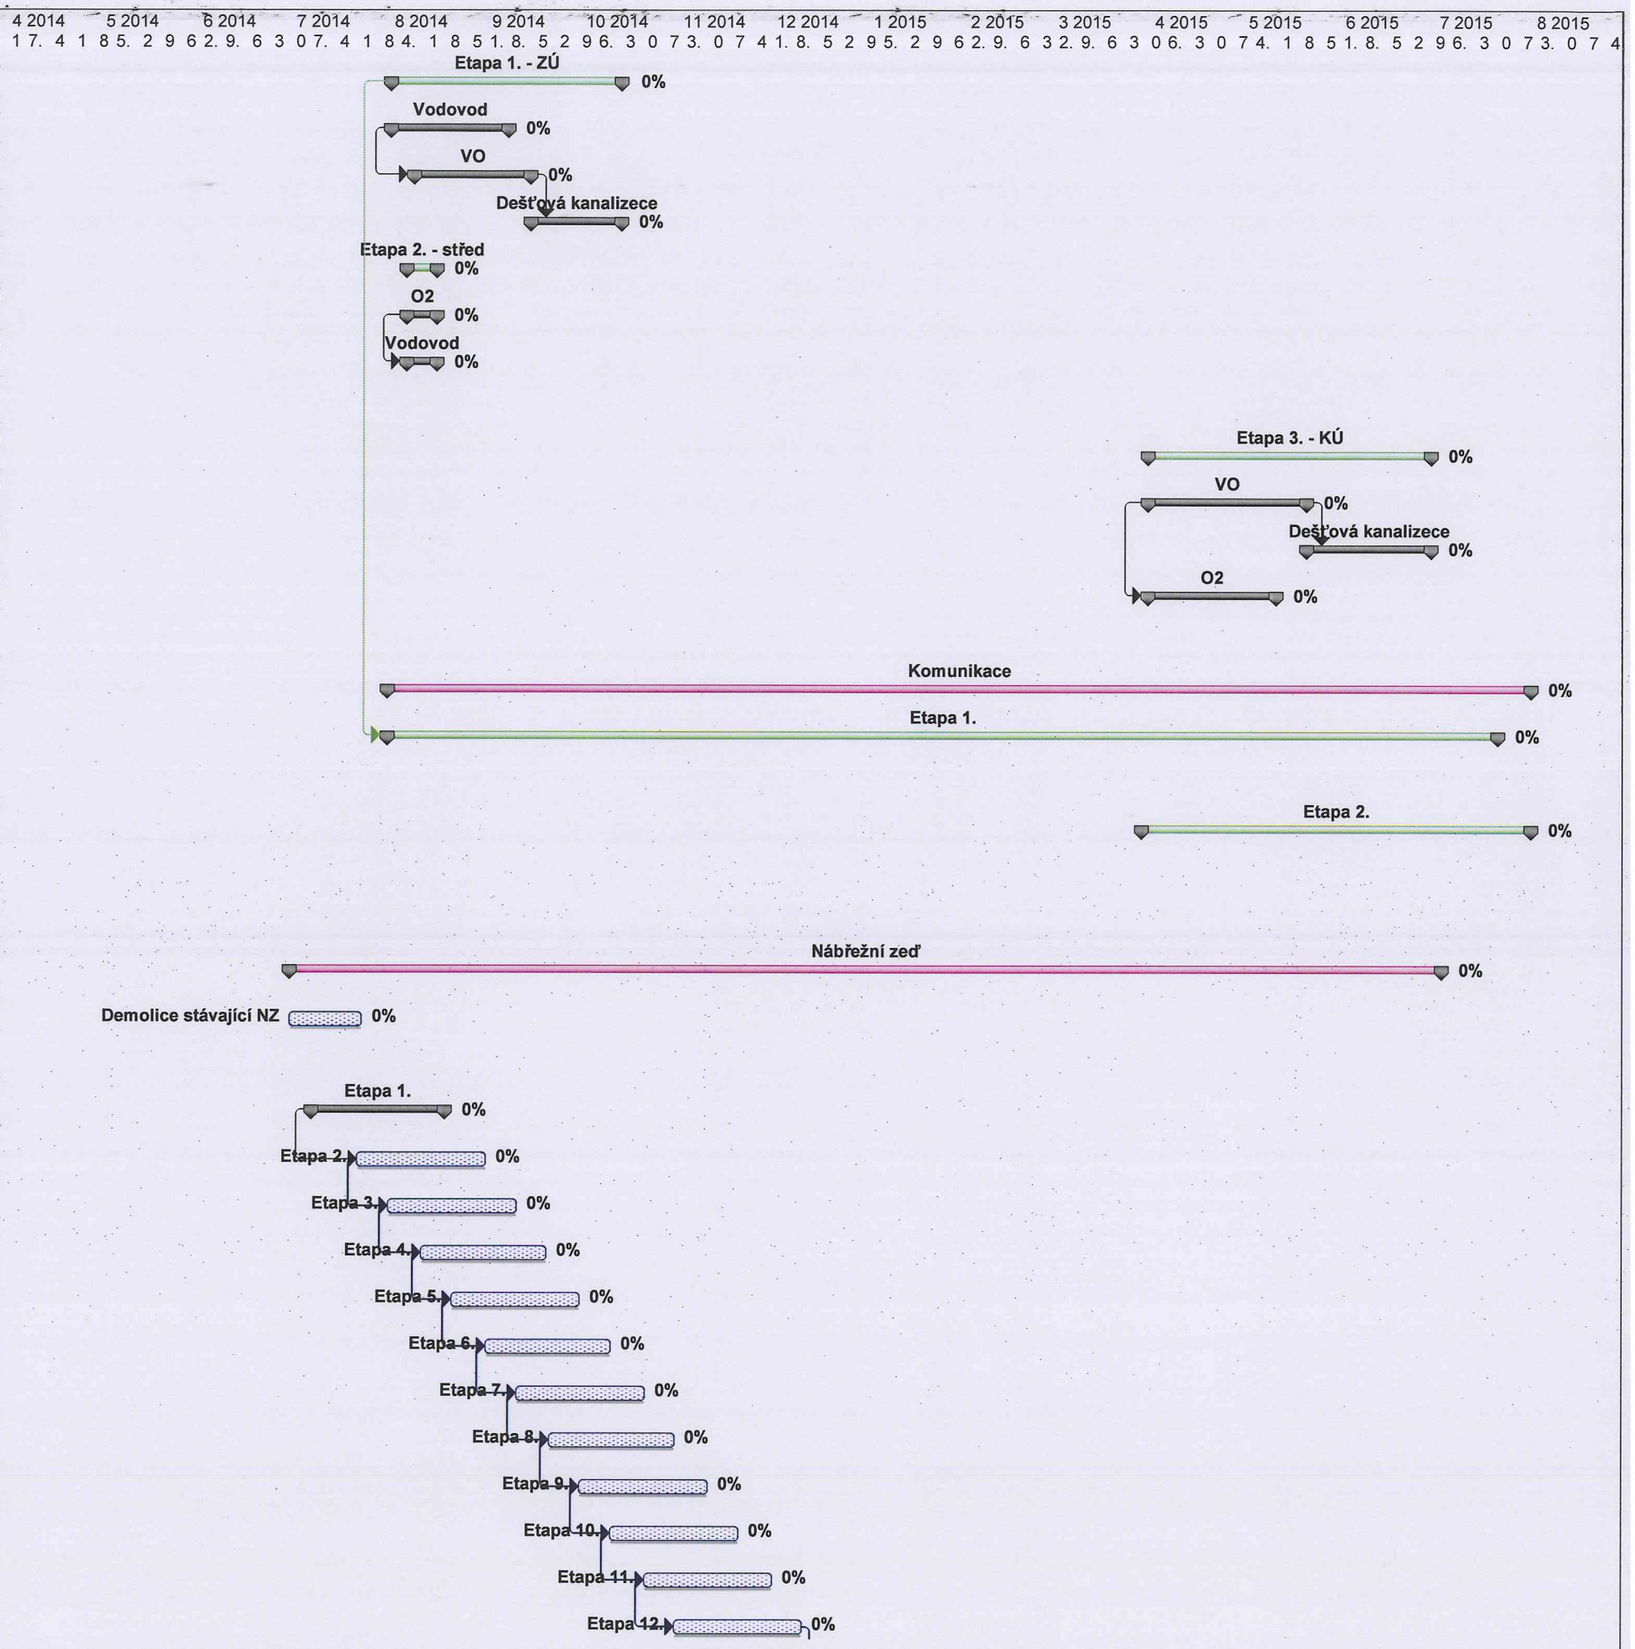

Projekt: HMG-Most Sloup-2.
Datum: 13.6. 14

Úkol | Průběh | Souhrnný | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení | Milník | Souhrn projektu | Vnější milník

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Dokončeno %
157	Klimatická přestávka	70 dny	12.12. 14	24.3. 15	0%
158	Etapa 13.	28 dny	24.3. 15	4.5. 15	0%
159	Etapa 14.	28 dny	3.4. 15	14.5. 15	0%
160	Etapa 15.	28 dny	14.4. 15	23.5. 15	0%
161	Etapa 16.	28 dny	23.4. 15	3.6. 15	0%
162	Etapa 17.	28 dny	4.5. 15	13.6. 15	0%
163	Etapa 18.	28 dny	14.5. 15	24.6. 15	0%
164	Etapa 19.	28 dny	25.5. 15	3.7. 15	0%
165					
166	**Protihluková stěna**	**80 dny**	**1.8. 14**	**25.11. 14**	**0%**
167					
168	**V patkách**	**52 dny**	**1.8. 14**	**15.10. 14**	**0%**
174					
175	**Na monolitické zdi**	**72 dny**	**13.8. 14**	**25.11. 14**	**0%**

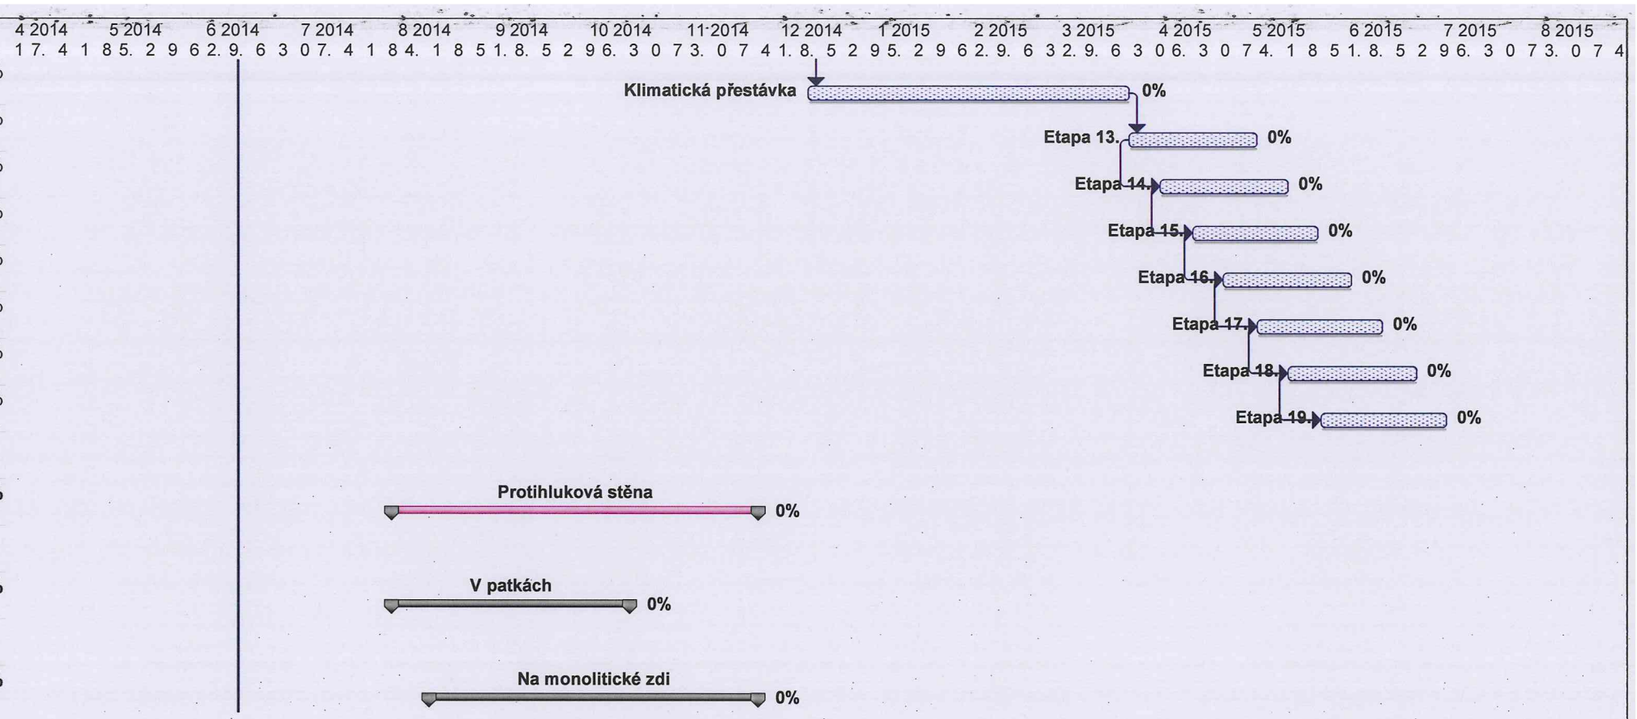

Projekt: HMG-Most Sloup-2.
Datum: 13.6. 14

Úkol | Průběh | Souhrnný | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení | Milník | Souhrn projektu | Vnější milník
